



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جلسه شانزدهم

شورای راهبری جویشگر (موتور جستجوی بومی)

۱۶ شهریورماه ۹۴



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



سرفصل مطالب

- ارائه گزارش یوز
- مروری بر گزارش پارسی جو
- ارائه گزارش در خصوص پیشرفت طرح
- سایر موارد



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



در خصوص پروژه یوز

- در جلسه ۱۲ شورای راهبری مورخ ۲۳ / ۰۴ / ۹۴ گزارش یوز ارائه شد که شورا پس از بررسی به جمع بندی زیر رسید:
- به سازمان اعلام گردد تا زمانیکه شروع پروژه جدید از سوی شورای راهبری ابلاغ نشده، در خصوص یوز هزینه جدیدی صورت نگیرد و به منظور تسریع در امور توسعه موتور جستجوی یوز، مجری پیشنهاد خود را در قالب فراخوان طرح جویشر ارائه نماید.
- از معاونت محترم برنامه ریزی وزارتخانه درخواست گردد تا هرگونه هزینه کرد جدید در راستای موضوع طرح جویشر منوط به ابلاغ شورای راهبری شود.



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



سرفصل مطالب

- ارائه گزارش یوز
- مروری بر گزارش پارسی جو
- ارائه گزارش در خصوص پیشرفت طرح
- سایر موارد



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



پارسی جو :

موتور جستجوی فارسی



شرکت (دانش بنیان) پارسی جو
با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطلاعات و دانشگاه یزد

پارسی جو
جستجوگر ایرانی

5

موتور جستجوی فارسی

وضعیت سرویسها (۱)

سرویسها	وضعیت کنونی	وضعیت تا زمان افتتاح (مهر ماه)
وب	پوشش وب به حدود شصت میلیون صفحه با دقت هفتاد درصد رسیده است.	افزایش پوشش هفتصد میلیون صفحه افزایش دقت نتایج ۷۰ درصد بهبود زمان بروزآوری به کمتر از یک ساعت
تصویر	پوشش تصاویر به حدود هشتاد میلیون تصویر رسیده است.	افزایش پوشش به یکصد میلیون تصویر
ویدئو	پوشش ویدئو به حدود پانصد هزار ویدئو رسیده است.	افزایش پوشش به یک میلیون ویدئو
خبر	قابلیت نمایش خبرهای ویدئویی، دسته بندی هوشمند خبرها و انتخاب خبرگزاری به سرویس خبر افزوده شد.	تکمیل قابلیت شخصی سازی صفحه خبر به انتخاب کاربران (انتخاب دسته بندی و خبرگزاریها) پوشش خبرگزاری شهرستانها و افزایش سایتها امکان جستجو در تصاویر و فیلمهای خبری شبکه اجتماعی خبر
واسط کاربر	طراحی لوگوی جدید پارسی جو و تم جدید صفحه اول پارسی جو تمام شده و کار پیاده سازی آن نیز تا نیمه شهریور به پایان می رسد. تم جدید صفحه نتایج نیز تا انتهای شهریور به بهره برداری می رسد.	در طراحی جدید واسط کاربر که تا زمان افتتاح کاملاً به بهره برداری میرسد، نتایج سرویسهای مختلف به صورت زیبا و حرفه ای در کنار یکدیگر در صفحه اول و صفحه نتایج جستجوی وب نمایش داده می شوند.
دانلود	سرویس دانلود با قابلیت جستجوی انواع فایلها (نرم افزار، فیلم، صوت، کتاب و ...) در بیش از ۲۰ سایت معتبر دانهودی پیاده سازی شده و هم اکنون مراحل تست نهایی خود را می گذراند.	نسخه اولیه این سرویس از طریق آدرس زیر قابل دسترس است: download.parsijoo.ir



6

وضعیت سرویسها (۲)

سرویسها	وضعیت کنونی	وضعیت تا زمان افتتاح (مهر ماه)
بازار	سرویس بازار با قابلیت جستجوی محصولات مختلف در بیش از ۲۰ سایت معتبر فروشگاه آنلاین و با نمایش مشخصات محصول (قیمت، موجودی، ویژگیها) پیاده سازی شده و هم اکنون مراحل تست نهایی خود را می گذراند.	نسخه اولیه این سرویس از طریق آدرس زیر قابل دسترس است: bazaar.parsijoo.ir
ایمیل	یکپارچه سازی سرویس ایمیل و خدمات پارسی جو تقریباً به اتمام رسیده و هم اکنون مشغول تست نهایی ارتباطات مابین دو مرکز داده هستیم. با توجه به تجربه منحصر بفرد این ادغام، کلیه روندها و سناریوهای احتمالی باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.	سرویس ایمیل پارسی جو (با همکاری یکی از سرویس دهندگان داخلی) در حال پیاده سازی می باشد که تا زمان افتتاح به بهره برداری خواهد رسید.
کافه کجا	سرویس کافه کجا، امکان ثبت موقعیتهای مکانی را (نظیر فروشگاهها، مکانهای دیدنی، مراکز خدماتی و...) توسط کاربران فراهم می آورد. صاحب کسب و کار می تواند مشخصات فروشگاه خود را (توضیح، مکان روی نقشه، ساعت کاری، امکانات و...) در نقشه ثبت کند و کاربران میتوانند در مکانهای مختلف جستجو کرده و راجع به آنها نظر و امتیاز دهند. کار پیاده سازی این سرویس به اتمام رسیده و هم اکنون مراحل تست نهایی خود را می گذراند.	نسخه اولیه این سرویس از طریق آدرس زیر قابل دسترس است: cafejoja.parsijoo.ir قابلیتهایی نظیر امکان ثبت و دریافت تخفیف و همینطور حراجی و پرسش و پاسخ نیز تا زمان افتتاح در نظر گرفته شده اند و پس از آن، شبکه اجتماعی کسب و کار و مکانیزم دلالتی در برنامه خواهد بود.



7

وضعیت سرویسها (۳)



سرویسها	وضعیت کنونی	وضعیت تا زمان افتتاح (مهر ماه)
قیمت	. هم اکنون، قیمت برخی از آیتمهای شاخص (نظیر ارز، سکه، سهام بورس) در پارسی جو قابل جستجو و نمایش می باشد.	جستجو و نمایش قیمت طیف وسیعی از محصولات مهم (خودرو، لوازم خانگی و...)
استخدام	سرویس استخدام فرصتهای شغلی را از سایتهای معتبر در این زمینه خزش کرده و قابلیت جستجو و نمایش نتایج مربوطه را برای کاربران فراهم می آورد. کار پیاده سازی این سرویس به اتمام رسیده و در حال تست و افزودن قابلیتهای جدید هستیم.	جستجو و نمایش فرصتهای استخدامی تا انتهای شهریور
موبایل	تا اکنون، سه اپلیکیشن اندرویدی پارسی جو، خبر جو و ترجمه توسط پارسی جو ارائه شده است. کار توسعه ورژن جدید اپلیکیشنهای پارسی جو و خبر جو به اتمام رسیده و تا انتهای هفته بعد در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. ورژن اول اپلیکیشن کافه کجا نیز مراحل نهایی تست خود را می گذراند.	علاوه بر ورژن جدیدی که تا هفته آینده به بهره برداری می رسد، تا زمان افتتاح نسخه متفاوت دو برنامه پارسی جو و خبر جو با پیاده سازی قابلیتهای جدید و رفع باگهای قبلی منتشر خواهند شد. برای مثال، برنامه خبر جو دارای قابلیت انتخاب خبرگزاری به سلیقه کاربر خواهد شد. همچنین، اپلیکیشن اندرویدی سرویس کافه کجا تا انتهای شهریور ارائه خواهد گردید.
نقشه	هفته گذشته، نسخه جدید نقشه با سرعت و دقت بالاتر بر روی محیط آنلاین قرار گرفت.	تا شش ماه آینده تمام این شهرها به صورت کامل پوشش داده میشوند. همچنین تعداد شهرها به ۱۳۰۰ شهر افزایش پیدا میکند.



8

آمار بازدید پارسی جو

کل کوثری ها: ۱۳۰۰۰۰





سفر وزیر محترم به یزد



آمار بازدید پارسی جو (۲)

کل کوثری ها: ۱۳۰۰۰۰



کسب و کار

- پتانسیل درآمد روزانه حداقل ۲۰۰ میلیون تومانی
 - یکصد میلیون پرس وجو و ارزش هر کلیک حداقل دویست تومان
 - حدود ۵۰ درصد از تبلیغات اینترنتی در دنیا معطوف به تبلیغات متنی و هدفمند می‌باشد.
- منابع درآمدی پارسی جو
 - تبلیغات هدفمند + تبلیغات بنری + فروش سازمانی (بیش از ۱۲۸ میلیون تومان)
- جذب تبلیغ کنندگان از طریق واسطه های تبلیغاتی
 - aNetwork.FastClick
- مطابق طرح تجاری رسیدن به خودکفایی مالی در انتهای سال سوم



11

تبلیغات پارسی جو از ۹۳ تا شهریور ۹۴

- تعداد تبلیغات بنری: ۲۵
- تعداد تبلیغات هدفمند: ۸۰ (بیشتر تعداد شارژ مجدد)
- درآمد کل: ۸۷.۳۵۰.۰۰۰ ریال
- درصد کاربران با شارژ مجدد: ۷۰ درصد
- نمودار زمان شارژ:



12

مدل حمایتی درخواست شده توسط شرکت

• خرید سرویس، محصولات و خروجیهای جویشر

- پرداخت هزینه با توجه به تعداد پرس و جو و با توجه به نسبت تحقق اهداف کمی و کیفی مطرح شده در هر فاز
- سرس کد مربوط به موتور جستجو
- مانند گراف وب، داده لاگ و گراف دانش (به صورت دوره‌ای و آفلاین و در قالبی مشخص و ثابت)



13

برنامه افتتاح

- تلاش شبانه روزی پارسی جو برای ارتقاء و بهره برداری از سرویسهای جدید
- رشد و پیشرفت قابل توجه در چند ماه گذشته
- مشکلات مالی در خصوص پرداخت حقوق منابع انسانی و سایر هزینه های شرکت



14

نیاز مبرم پارسی جو

- چالش اصلی: تأمین منابع مالی
 - تأمین هزینه های نیروی انسانی (عدم پرداخت حقوق ۳ ماه گذشته)
 - تأمین هزینه های تبلیغات (علیرغم برنامه ریزیهای انجام شده)
 - صرف ۳۰۰ میلیون وام (شرکتهای دانش بنیان و ...) و سرمایه گذاری شخصی
 - امکان از دست دادن نیروهای زبده پارسی جو
 - خطر از دست دادن فرصت افتتاح و از آن مهمتر، شکست پروژه موتور جستجو
 - نگرانیهای مالی مسائل فنی را تحت تاثیر قرار داده
- راه حل کوتاه مدت (فوری)
 - تأمین منابع از هر طریق ممکن برای برنامه افتتاح



15

پیشنهاد مدیریت طرح

- تسریع در قرارداد جدید پارسی جو در قالب فراخوان
- ادغام تیم پارسی جو با مدیریت طرح (بخش فنی) با مدل مشارکتی در قالب طرح
- اصلاح شرح خدمات از مدیریت طرح به توسعه جویسگر بومی
- ترکیب سایر سرویسها از طریق فراخوان و همکاری با سایر تیمها



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات




سرفصل مطالب

- ارائه گزارش یوز
- مروری بر گزارش پارسی جو
- ارائه گزارش در خصوص پیشرفت طرح
- سایر موارد



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نمودار موزی پیشرفت طرح

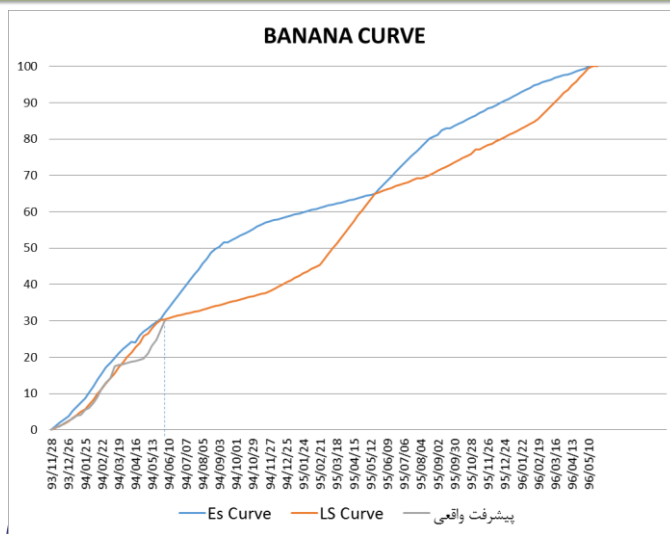

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وضعیت پروژه های طرح

ردیف	پروژه	وضعیت	زمان شروع	زمان خاتمه	درصد پیشرفت دوره قبل	درصد پیشرفت این دوره	مجری
۱	مدیریت طرح موتور جستجوی بومی	در حال اجرا	۹۳/۱۱/۲۷	۹۶/۰۵/۲۷	۲۳	۳۰	علیرضا یاری
۲	پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو)	در حال اجرا	۹۳/۰۳/۲۰	۹۴/۰۳/۲۰	۴۲	۵۳	دانشگاه یزد
۳	طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به منظور ارتقاء و بهبود سامانه های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی -	در حال اجرا	۹۲/۱۰/۰۷	۹۴/۱۰/۰۷	۸۴	۸۶	دانشگاه امیر کبیر
۴	توسعه و یکارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به عنوان سرویس در مرکز داد-	در حال اجرا	۹۳/۰۹/۰۱	۹۴/۰۷/۰۱	۵۵	۷۰	احسان کشتکاری
۵	خرید پهنای باند برای موتور جستجو 1-STM	در حال اجرا	۹۴/۰۳/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	-	۹۵	والی نژاد



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وضعیت پروژه های مدیریت طرح

۶	طراحی و ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبار سنجی خدمات وب فارسی	در حال اجرا	۹۴/۰۲/۲۷	۹۵/۰۲/۲۷	۱۵	۱۸	مژگان فرهودی
۷	تدوین ساختار و روشهای همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی	در حال اجرا	۹۴/۰۳/۱۰	۹۴/۰۸/۱۰	۵۰	۶۰	ایوب محمدیان
۹	تجهیز مرکز داده اینترنتی خرید ۲۰۰ دستگاه سرور super micro برای موتور جستجو	منتظر برگزاری مناقصه است اصلاحیه انجام شود	-	-	-	-	
۱۰	تجهیز مرکز داده اینترنتی خرید SAN	در حال اجرا	۹۳/۱۵/۲۲	۹۴/۸/۱۵	-	-	
۱۱	تجهیز مرکز داده اینترنتی خرید سوئیچ های Nexus برای مرکز داده اینترنتی - تجهیزات فنی	منتظر بازگشایی پاکت جواب ها بر اساس سفارش	-	-	-	-	
۱۲	تجهیز مرکز داده اینترنتی خرید تابلو پست برق	در حال اجرا	-	-	-	-	



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پروژه های خاتمه یافته در طرح

- توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین
- خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری-پروژه پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش ۵۰۰ میلیون
- راهبری و پایش بر پروژه پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش ۵۰۰ میلیون
- راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی پژوهشگاه فضای مجازی
- سرویس و نگهداری دو دستگاه ups
- خرید فیبر تارک
- خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت به میزان ۵۰ Mbps و اینترنت
- راهبری، سرویس و نگهداری سالیانه BMS و اعلام حریق ساختمان اصلی
- تجهیز مرکز داده اینترنتی خرید ۴ دستگاه سرور برای موتور جستجو



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



مهمترین فعالیتهای انجام شده

- مطالعات تطبیقی، راهبردی و فناوری مربوط به طرح
- برنامه ریزی مدیریت طرح (چارتر، نظام نامه، مدیریت ریسک و پیکربندی)
- برنامه ریزی عملیاتی و طراحی پروژه های مورد نیاز
- برنامه ریزی راهبری
- انجام فراخوان و انتخاب لیست کوتاه
- تدوین RFP های پروژه های مربوط به فراخوان



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



مشکلات و موانع در مدیریت طرح

- گستردگی طرح جویشگر بسیار زیاد است بطوریکه کنترل و یکپارچه سازی با چالش بسیار مواجه می باشد.
- عدم یکپارچگی سازمان فناوری اطلاعات با طرح جویشگر که دسترسی و هدایت جویشگر یوز را دچار مشکل نموده است.
- ارتباط با صاحبان محتوا پیشرفت مناسب نداشته است.
- تنوع در خدمات و تعداد زیاد پیمانکاران که فراخوان و انتخاب پیمانکاران مناسب



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشکلات اجرایی طرح

- تدارکات در طرح
- گزارشات مالی طرح
- اخذ مشاور
- روشن نبودن جایگاه مجری طرح



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سرفصل مطالب

- ارائه گزارش یوز
- مروری بر گزارش پارسی جو
- ارائه گزارش در خصوص پیشرفت طرح
- سایر موارد



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



ارزیابی فراخوان

- نحوه ارزیابی و لیست کوتاه در سایت اطلاع رسانی طرح قرار داده شد.
- با نامه ای ارزیابی به شرکتها اعلام شد.
- شرکتهای پروفایل خود را درست کرده اند.
- اطلاعات ریز در پروفایلهای شرکتهای در حال قرار گیری است. جزئیات



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



گرت پژوهشی

- اخذ نیازهای پژوهشی طرح از شرکتها از طریق سایت
- دریافت پیشنهاد پژوهشی در قالب گرت پژوهشی از طریق سایت
- دریافت پیشنهاد حمایت از پایان نامه ها
- ارزیابی و اعطای حمایتها در قالب ساختار و فرایندهای مرکز
- ارائه گزارش به شورای راهبری در هر دور
- قرار دارد خروجیها در سایت اطلاع رسانی طرح



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



نحوه انجام فراخوان طرح

- اگر از سایت طرح باشد. امکان دریافت پاکات قیمت نیست.
- آیا می توان قیمت و پیشنهاد را از سایت الکترونیکی دریافت کرد.



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات



و من الله التوفيق



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

